


Project Aanpak



- *Vroegtijdig inzicht in functionaliteit, investering, doorlooptijd en resultaat;*
- *Inzicht in rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden;*
- *Inzicht in de betrokkenheid van de organisatie, gebruikers en leverancier(s);*
- *Opgeleide en tevreden gebruikers.*

Gebaseerd op 25 jaar ervaring met het implementeren van Document Management & Control (DMC), hebben wij een projectmatige aanpak ontwikkeld die u helpt snel en efficiënt DMC te implementeren met het juiste resultaat. Onze methode waarborgt een betrouwbare en efficiënte implementatie van DMC op basis van Cadac Organice en Microsoft SharePoint.

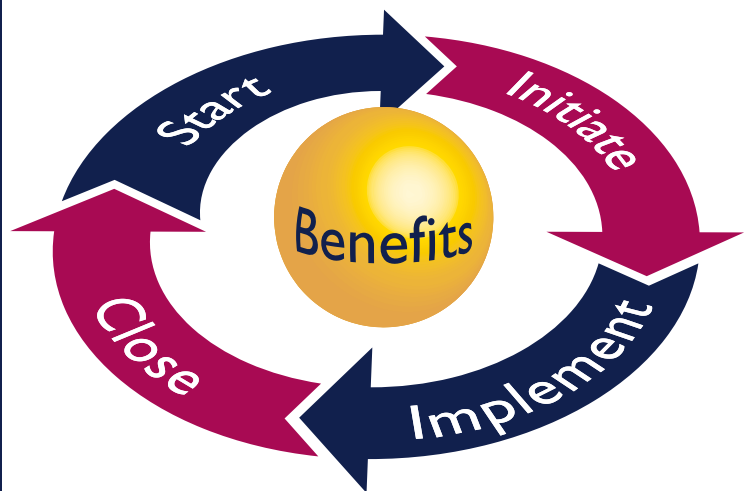

Succesvolle implementatie

De implementatie van DMC betekent vaak een verandering van het werkproces en grijpt daardoor in op veel aspecten van uw bedrijfsvoering waarbij verschillende disciplines van uw organisatie betrokken zijn. Hierdoor is de implementatie van DMC als een complex project te beschouwen die een projectmatige aanpak vereist.

Projectorganisatie

Onze ervaring is dat de bestaande (lijn-)organisatie van een klant er niet op ingericht is om een dergelijk project uit te voeren. Daarom zetten wij met u een tijdelijke projectorganisatie op bestaande uit een stuurgroep en een projectgroep, die wij bij uitstek geschikt achten voor het uitvoeren van een dergelijke complexe implementatie.



Gebaseerd op PRINCE2

De Cadac Organice Project Aanpak is gebaseerd op de methode PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments). Hiermee biedt Cadac Organice haar klanten een best-practice methode voor de implementatie van DMC. Onze methode gaat uit van de volgende voorwaarden voor een succesvolle implementatie:

- I. Het project wordt uitgevoerd volgens de Cadac Organice Project Aanpak
- II. Wensen en eisen zijn vastgelegd in een business case en een requirements document
- III. Er is een projectorganisatie opgezet met een Stuurgroep en Projectgroep
- IV. Er is een Projectmanager aangesteld
- V. Er zijn werkpakketten gedefinieerd die in opeenvolgende projectfasen worden uitgevoerd
- VI. Wijzigingen en veranderingen worden geautoriseerd door de Stuurgroep

Opstarten project

Bij de opstart van het project worden de eisen en wensen besproken, het bestaande werkproces globaal in kaart gebracht en de oplossingsrichting geschetst. Indien nodig worden Awareness Sessies georganiseerd om een beeld te geven van de mogelijkheden van Cadac Organice en Microsoft SharePoint. Tijdens deze sessies krijgen de deelnemers een eerste indruk van de functionaliteit van DMC en kunnen ze de voordelen ervan voor de organisatie benoemen.

Initiatiefase

In de Initiatiefase wordt de haalbaarheid van het project vastgesteld op basis van de te behalen voordelen, de te verwachte baten en de investeringen. Daarnaast wordt de projectorganisatie ingericht en wordt de uitvoeringsfase voorbereid door het maken van een detailplan met werkpakketten, een projectplan en een communicatieplan. Ook wordt er een risico analyse uitgevoerd en indien nodig worden er risicomatregelen afgesproken.

Aan de hand van interviews met key-users worden het bestaande en het toekomstige werkproces beschreven en wordt er een Pilot of POC (Proof of Concept) ingericht. Deze Pilot heeft uitsluitend als doel de functionaliteit van Cadac Organice en SharePoint te verkennen en de toepassing ervan voor het werkproces van de gebruiker te onderzoeken; het is dus geen productietoepassing. Het vertrekpunt voor deze Pilot is een branche-specifiek Best-Practice Template in SharePoint. Tijdens de Pilot worden uw eisen en wensen verder gedetailleerd en vastgelegd in een Requirements Document. Op deze manier wordt binnen een beperkt aantal iteratieslagen de Out-Of-The-Box functionaliteit van Cadac Organice en SharePoint geëvalueerd en de eventuele, additionele benodigde functionaliteit gedefinieerd.

Verder wordt de Business Case verfijnd en aangescherpt, waarmee het bedrijfsmanagement de bedrijfseconomische haalbaarheid van het project kan beoordelen. In overleg met key-users en (afdelings-)management wordt de uitrol en de beschikbaarheid van DMC bepaald.

Implementatie fase

Tijdens de implementatie fase worden er per werkpakket één of meerdere producten en diensten geleverd. Het resultaat van elk werkpakket wordt op kwaliteit getoetst en opgeleverd. Periodiek worden eventuele nieuwe risico's in kaart gebracht en besproken en worden er afspraken gemaakt om de risico's te beheersen.

Het project wordt uitgevoerd door de projectgroep. Eventuele wijzigingen of veranderingen worden besproken met de stuurgroep en pas na goedkeuring van de stuurgroep uitgevoerd.

Projectafsluiting

Als alle werkpakketten zijn opgeleverd en geaccepteerd wordt het project afgesloten met het in gebruik nemen van de oplossing. Voor het succesvol inzetten van DMC in uw organisatie worden uw gebruikers getraind en on-site begeleid. Indien nodig kan er een vervolgproject gestart worden, bijvoorbeeld voor additionele functionaliteit of voor verdere uitrol in de organisatie. Hierbij worden de verschillende fases opnieuw doorlopen.

Cadac Organice BNL BV

Nieuw Eyckholt 282
6419 DJ Heerlen
Nederland

T: +31 45 400 1010
F: +31 45 400 1011

sales.benelux@organice.com

www.organice.com
www.cadac.com

Heerlen | Gouda | Meppel | Vianen | Hasselt [B]
